

Приложение 1  
к распоряжению Главного управления  
территориальной политики  
Московской области  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

«УТВЕРЖДЕНА  
распоряжением Главного управления  
территориальной политики  
Московской области  
от 30.10.2020 № 18  
(в редакции распоряжения  
Главного управления  
территориальной политики  
Московской области  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_)

Форма

## ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округа Ступино Московской области

Наименование проекта Приобретение многофункциональных устройств, музыкального центра, приобретение и установка дверных блоков, ремонт душевой для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» городского округа Ступино Московской области, по адресу: с. Старая Ситня ул. Центральная вл. 11А, городской округ Ступино, Московской области.

**1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:**

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.		Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Примечание		
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *		
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9	
500000	381150	118850	0	500000	381150	118850	0	437820,4	333750,5	104069,9	0	62179,6	0

\* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

**2. Сведения об итогах реализации проекта.**

1. Объект, включенный в проект, завершен \_\_\_\_\_ своевременно (своевременно, с нарушением сроков)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: \_\_\_\_\_
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 19.08.2021 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 21.12.2021 г.

5. К отчету прилагаются на 3\_ листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

\_\_\_\_\_ Рубан Е.Г..  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)



Глава городского округа Ступино Московской области


\_\_\_\_\_ Мужальских С.Г..  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)



Дата « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

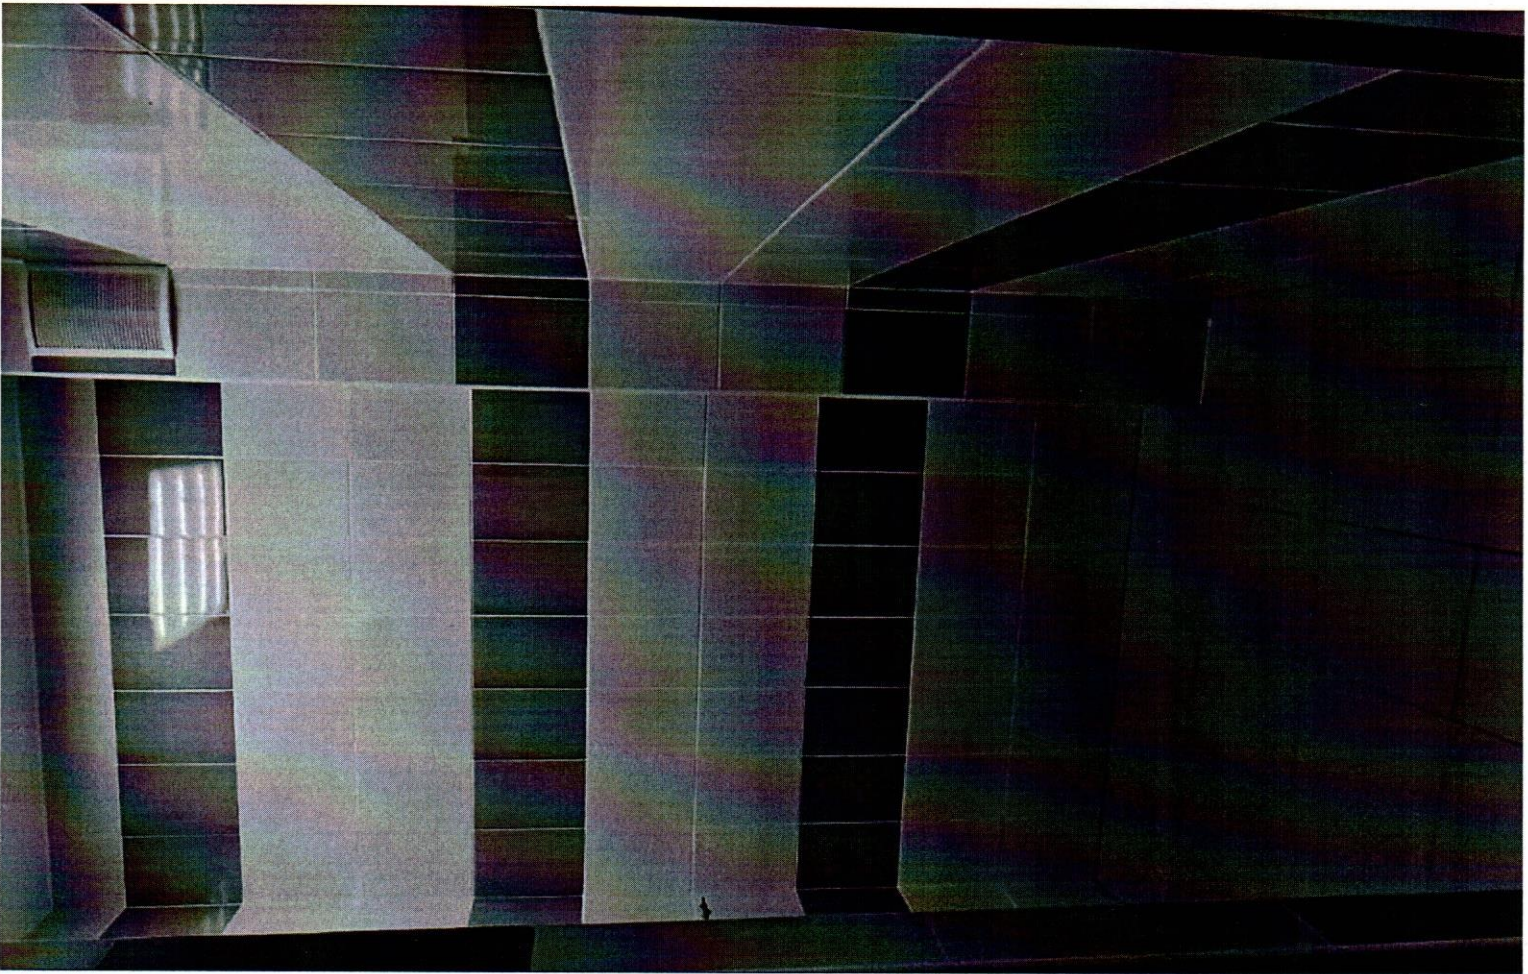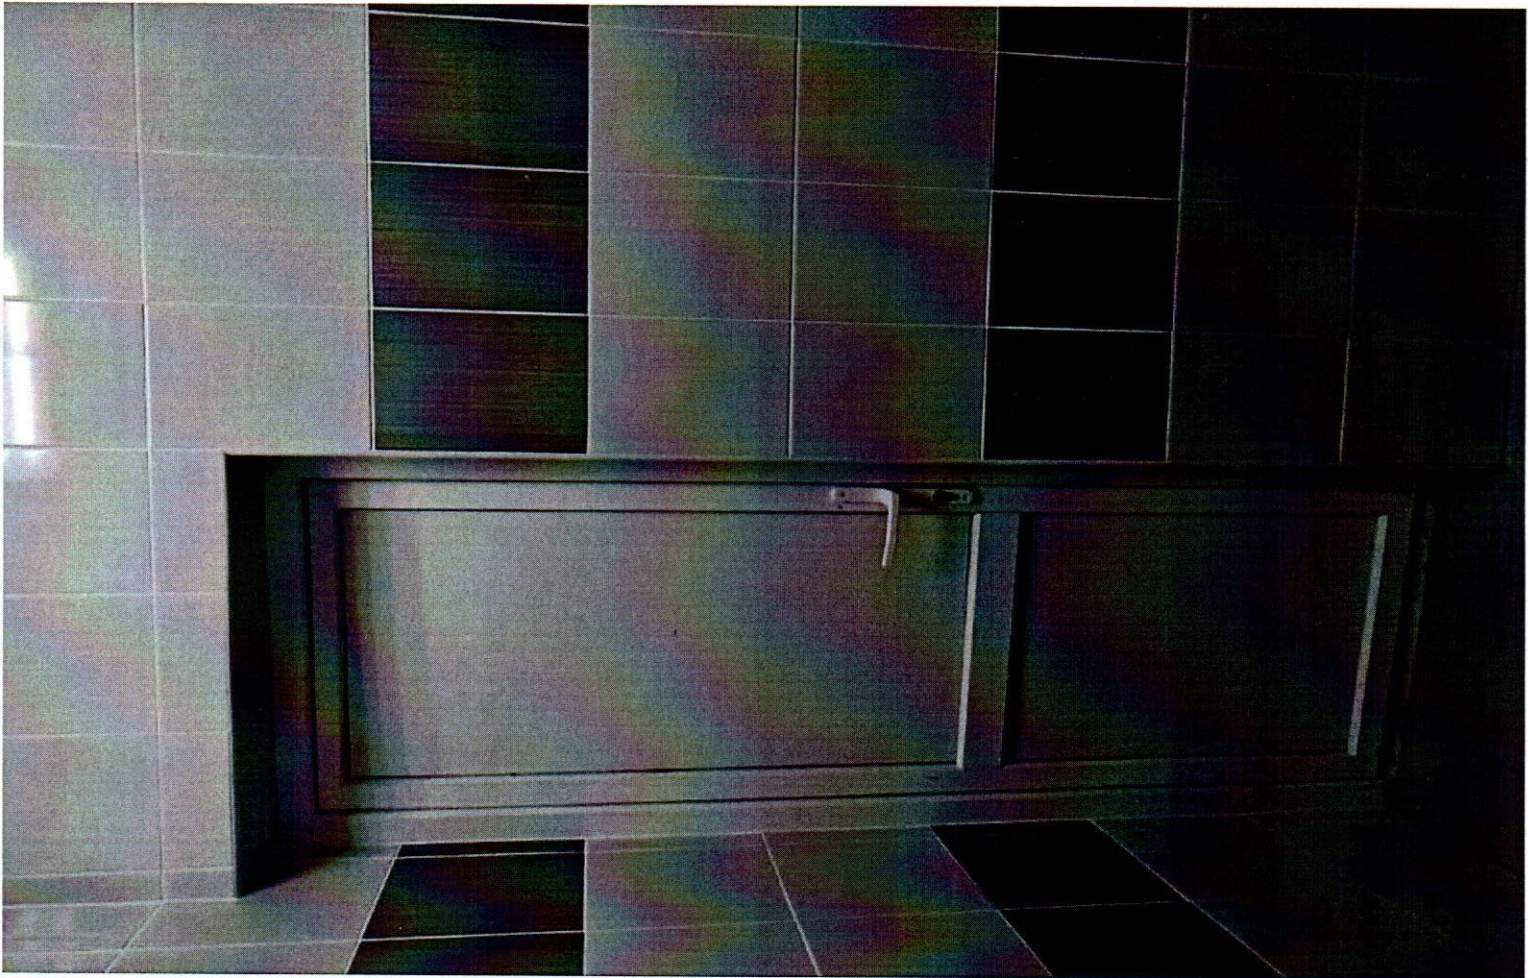



BB

